

Relatório de tarefas

Mig Soluções - GRA Instalações e Transportes Ltda

Telefone: 51 34777090

CNPJ: 12.507.499/0001-07

Email: mig@migsolucoes.com.br

Endereço: RUA 1500, nº 820 - SALA 2003 - BL 80 - BALNEARIO CAMBORIU - SC

Informações do cliente	
Nome do cliente DIEGO LEITE BOM LTDA ME	CPF/CNPJ -
Endereço Mauá Comex, R. Júlio de Castilhos, 80, Jaguarão - RS, 96300-000	
Telefone -	Falar com -
Tarefa #44955327	
Quem executou Ricardo Steigleder	Data/Hora 05/08/2024 às 14:04
Tipo de tarefa DIÁRIO DE OBRA - ULTRA RS	
Orientação 02B190+ REDE LIQUIDA AGENDADO COM DIEGO 53 984689602 LOCAL É RESTAUANTE FECHA AS 15:00 HS	
Check-in Não efetuou check-in	Checkout Não efetuou check-out
Relato de execução Hoje existe uma rede líquida no local pois a caixa de abastecimento está fora de norma devido estar próximo há janela e janela não tem como isolar,e próximo a ponto de equinicao,e rede líquida está próximos a energia elétrica,em visita no local definimos um local novo acesso na rua 20 de setembro, cliente solicitou também novos pontos de consumo,cliente vai abrir aonde vai ser interligação pois o tubo está concertado e amassado	
VISITA DE PROJETO TURNKEY	
1) % de gás nos tanques existentes.... Descrever abaixo os tanques individualmente P13 tanques estão vazio	
2) Ultrapronto Não	
3) Central civil Sim	
4) Se não estiver ok, o que é necessário para regularizar: Ok	
5) Prazo de conclusão das pendências -	
6) Necessario escada/andaime para execução de instalação? Sim ou não, se sim especificar Escada	

7) Existe viga/laje no trajeto da tubulação Não
8) Acesso dos tanques a central Por dentro do salão
9) Necessário munck? Não
10) Necessário instalação de balizador de vaga? Não
11) Central com portão Sim
12) Necessário furo em laje Não
13) Quem fará o furo .
14) Central em laje Não
15) Se necessário instalação de regulador em ponto de consumo, especificar aqui (mangueiras, conexão equipamento) -
16) Regulador 2º estagio -
17) Bitola interligação de rede -
18) Possui extintor Sim
19) Companhia que esta instalada Ultragaz
20) Necessidade de montagem Urgente
21) Melhor dia e horário de montagem Segunda a sexta horário comercial
22) Impossibilidades de execução Chuva
23) Distância do trajeto da mangueira de abastecimento 10 metros
24) Observação .
25) O cliente foi informado sobre as necessidades que devem ser executadas para a realização do serviço Sim
26) Ajudante? -

27) Quem?


28) É necessário realização de integração para realização da montagem?



Não


Fotos



rede líquida antiga



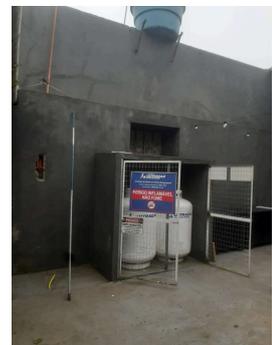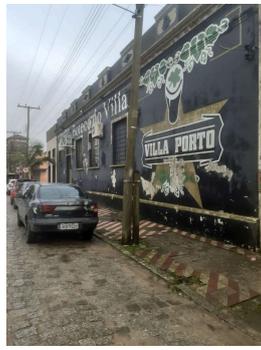




janelas não tem como vedar e ar condicionado próximo a caixa de abastecimento




novo local de tomada de abastecimento



cliente vai abrir para poder interligar pois a rede está danificada no local

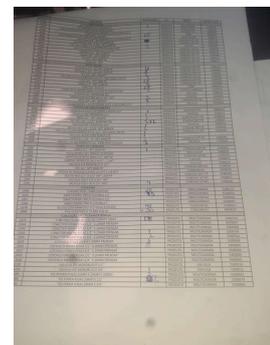

A photograph of a document page with a grid of data, possibly a survey or ledger. The grid consists of many rows and columns, with some text visible in the top left corner.

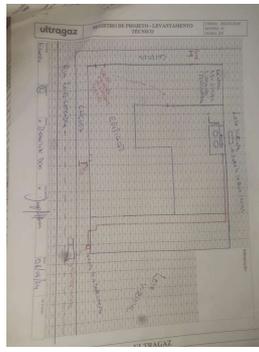

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.

Assinado por: Diego Leite, Documento: 011.988.210-86
