




RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA

CAMBARA SA PRODUTOS FLORESTAIS

Tubulação

2024

	RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DE TUBULAÇÃO CONFORME NR-13	Código: RG-CO.52.07 Revisão: 01 Página: 1/4
--	--	---

	Logo/Carimbo da Empresa	Nº. Relatório fornecedor TUBULAÇÃO 2024
---	-------------------------	--

IDENTIFICAÇÃO DA TUBULAÇÃO:

Proprietário: ULTRAGAZ/RS
Cliente: CAMBARA SA PRODUTOS FLORESTAIS
Endereço de Instalação: RUA OSVALDO KROEFF, SN - CENTRO
Etiqueta de identificação: -

TIPO DE TUBULAÇÃO

Fluido de serviço: GLP
Temperatura de operação: - 21° e < 65°
Pressão de operação: 1,5 kgf/cm²
Diâmetros: 1", 1.1/4"
Material: Aço Carbono

Descrição:

Rede vapor, bitola 1"
Rede líquida, bitola 1.1/4"

Identificação do instrumento (manômetro):

PI-1864, PI-1852, PI-1808, MAN-005, PI-1320, PI-1856, PI-1796

Identificação do instrumento (válvula):

PSV-1332, PSV-1807, PSV-133, PSV-135

CARACTERÍSTICAS DA INSPEÇÃO

Inspeção extraordinária iniciada em 30/08/2024 e finalizada em 30/08/2024


DESCRIÇÃO E RESULTADO DAS INSPEÇÕES

Resultado exame: Apto

PLANO DE INSPEÇÃO:

Inspeção conforme exame interno a cada 4 anos.

	<p align="center">RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DE TUBULAÇÃO CONFORME NR-13</p>	<p>Código: RG-CO.52.07</p> <p>Revisão: 01</p> <p>Página: 2/4</p>
---	--	--

	<p align="center">Logo/Carimbo da Empresa Nº. Relatório fornecedor TUBULAÇÃO 2024</p>
---	---

CONCLUSÃO

Verificado que a tubulação não possui pontos de vazamento. Apta a operar


RECOMENDAÇÕES E PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS

Trocar PSV-133, PSV-135 pois estão vencidas e instalar placa PSV-1332 que está quebrada.

DATAS PREVISTAS PARA PRÓXIMAS INSPEÇÕES



Inspeção: 30/08/2028

FOTOS:

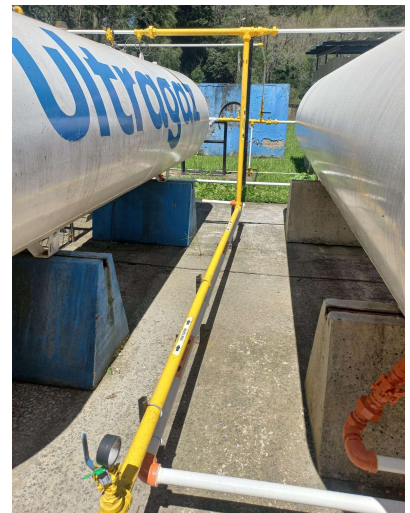



Logo/Carimbo da Empresa Nº. Relatório fornecedor
TUBULAÇÃO 2024

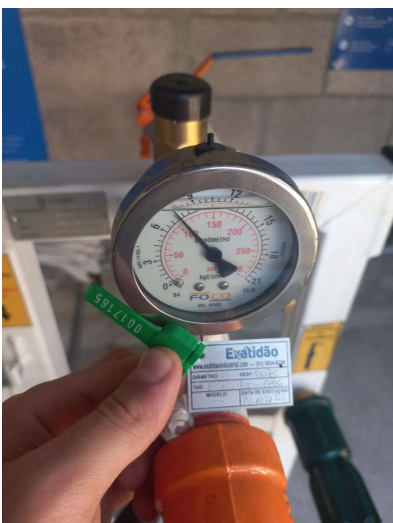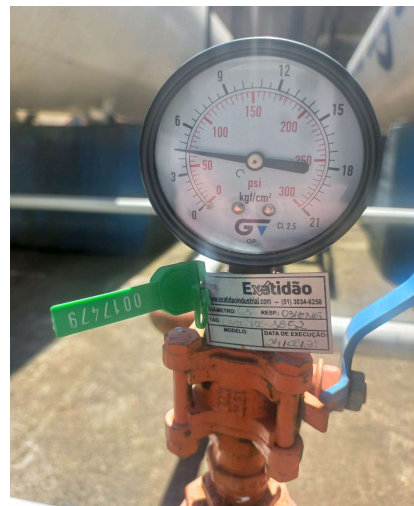

	RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DE TUBULAÇÃO CONFORME NR-13	Código: RG-CO.52.07 Revisão: 01 Página: 4/4
	Logo/Carimbo da Empresa Nº. Relatório fornecedor TUBULAÇÃO 2024	

RELAÇÃO PARCIAL DE EXIGÊNCIAS DA NR-13

ABREVIações

P = Possui; NP = Não possui; NA = Não aplicável; I = incompleto

ITEM DA NR-13	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO
13.6.1.1	Programa e plano de inspeção	P
13.6.1.2	Dispositivo de segurança contra sobre pressão na tubulação	P
13.6.1.3	Instrumento que indique a pressão de operação	P
13.6.1.4 a, b	Especificações e fluxograma da tubulação	P
13.6.1.4 c	Projeto de Alteração ou Reparo	NA

Local e data:

Canoas, 30/08/2024

Empresa Contratada:
GRA Instalações e Transportes de Gás Eireli
ENG. MIGUEL EDUARDO SUDBRACK
CREA RS038959
N.º da ART 13402321

Assinatura Engenheiro (PH)
