



**RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA**

# **EDIFICIO DOLCE VITA**

**Tubulação**

**2024**

	<b>RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DE TUBULAÇÃO CONFORME NR-13</b>	Código: RG-CO.52.07 Revisão: 01 Página: 1/4
---	--	---

	Logo/Carimbo da Empresa	Nº. Relatório fornecedor TUBULAÇÃO 2024
---	-------------------------	--

### IDENTIFICAÇÃO DA TUBULAÇÃO:

Proprietário: ULTRAGAZ/SC  
Cliente: EDIFICIO DOLCE VITA  
Endereço de Instalação: RUA 246, 312 - MEIA PRA ITAPEMA - SC  
Etiqueta de identificação: -

### TIPO DE TUBULAÇÃO

Fluido de serviço: GLP  
Temperatura de operação: - 21° e < 65°  
Pressão de operação: 1,5 kgf/cm<sup>2</sup>  
Diâmetros: 3/4"  
Material: Aço Carbono

### Descrição:

Rede líquida 3/4"

### Identificação do instrumento (manômetro):

NA

### Identificação do instrumento (válvula):

NA

### CARACTERÍSTICAS DA INSPEÇÃO

Inspeção periódica iniciada em 21/08/2024 e finalizada em 21/08/2024

### DESCRIÇÃO E RESULTADO DAS INSPEÇÕES

Resultado exame: Apto

### PLANO DE INSPEÇÃO:

Inspeção conforme exame interno a cada 6 anos.

	<b>RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DE TUBULAÇÃO CONFORME NR-13</b>	Código: RG-CO.52.07 Revisão: 01 Página: 2/4
---	--	---

	Logo/Carimbo da Empresa	Nº. Relatório fornecedor TUBULAÇÃO 2024
---	-------------------------	--

## CONCLUSÃO

Verificado que a tubulação não possui vazamento. Apta para operação.

## RECOMENDAÇÕES E PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS

NA

## DATAS PREVISTAS PARA PRÓXIMAS INSPEÇÕES


Inspeção: 21/08/2030

## FOTOS:





Logo/Carimbo da Empresa N°. Relatório fornecedor  
TUBULAÇÃO 2024

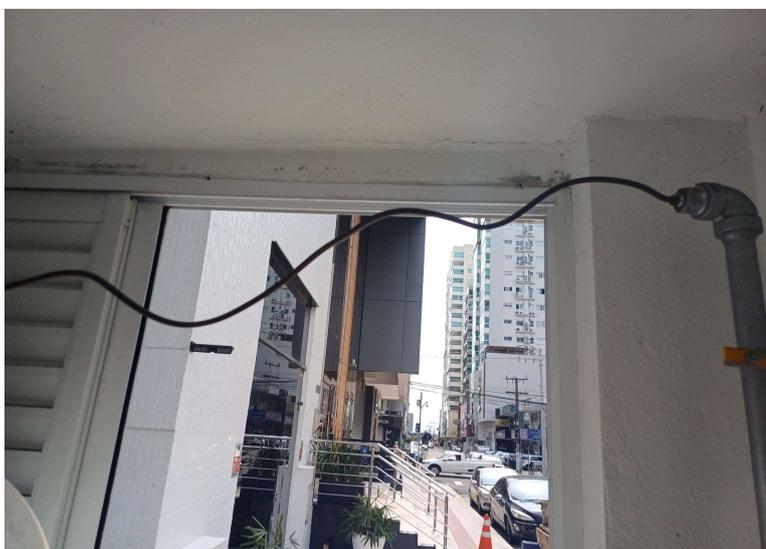

	<b>RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DE TUBULAÇÃO CONFORME NR-13</b>		Código: RG-CO.52.07 Revisão: 01 Página: 4/4
		Logo/Carimbo da Empresa	N°. Relatório fornecedor TUBULAÇÃO 2024

## RELAÇÃO PARCIAL DE EXIGÊNCIAS DA NR-13

### ABREVIACIONES

P = Possui; NP = Não possui; NA = Não aplicável; I = incompleto

ITEM DA NR-13	DESCRIPÇÃO	SITUAÇÃO
13.6.1.1	Programa e plano de inspeção	P
13.6.1.2	Dispositivo de segurança contra sobre pressão na tubulação	NA
13.6.1.3	Instrumento que indique a pressão de operação	NA
13.6.1.4 a, b	Especificações e fluxograma da tubulação	P
13.6.1.4 c	Projeto de Alteração ou Reparo	NA

Local e data:

Balneário Camboriu, 21/08/2024

Empresa Contratada:  
 GRA Instalações e Transportes de Gás Eireli  
 ENG. MIGUEL EDUARDO SUDBRACK  
 CREA SC 192948-0  
 N.º da ART 13398801

\_\_\_\_\_  
Assinatura Engenheiro (PH)
