



RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA

NAT CEREAIS E ALIMENTOS LTDA

Tubulação

2024

	RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DE TUBULAÇÃO CONFORME NR-13	Código: RG-CO.52.07 Revisão: 01 Página: 1/4
	Logo/Carimbo da Empresa	Nº. Relatório fornecedor TUBULAÇÃO 2024

IDENTIFICAÇÃO DA TUBULAÇÃO:

Proprietário: ULTRAGAZ/RS
Cliente: NAT CEREAIS E ALIMENTOS LTDA
Endereço de Instalação: R. Júlio Vanzin, 117 - Distrito Industrial II
Etiqueta de identificação: -

TIPO DE TUBULAÇÃO

Fluido de serviço: GLP
Temperatura de operação: - 21° e < 65°
Pressão de operação: 1,5 kgf/cm²
Diâmetros: 3/4"
Material: Aço Carbono

Descrição:

Rede vapor e rede líquida, bitola 3/4"

Identificação do instrumento (manômetro):

PI-1903 (REDE VAPOR), PI-1901 (VAPORIZADOR)

Identificação do instrumento (válvula):

PSV-1855 (REDE LÍQUIDA), PSV-1856 (VAPORIZADOR)

CARACTERÍSTICAS DA INSPEÇÃO

Inspeção periódica iniciada em 22/10/2024 e finalizada em 22/10/2024


DESCRIÇÃO E RESULTADO DAS INSPEÇÕES

Resultado exame: Apto

PLANO DE INSPEÇÃO:

Inspeção conforme exame interno a cada 6 anos.

	RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DE TUBULAÇÃO CONFORME NR-13	Código: RG-CO.52.07 Revisão: 01 Página: 2/4
---	--	---

	Logo/Carimbo da Empresa	Nº. Relatório fornecedor TUBULAÇÃO 2024
---	-------------------------	--

CONCLUSÃO

Verificado que a tubulação não possui pontos de vazamento. Apta a operar

RECOMENDAÇÕES E PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS

NA

DATAS PREVISTAS PARA PRÓXIMAS INSPEÇÕES


Inspeção: 22/10/2030

FOTOS:





Logo/Carimbo da Empresa N°. Relatório fornecedor
TUBULAÇÃO 2024

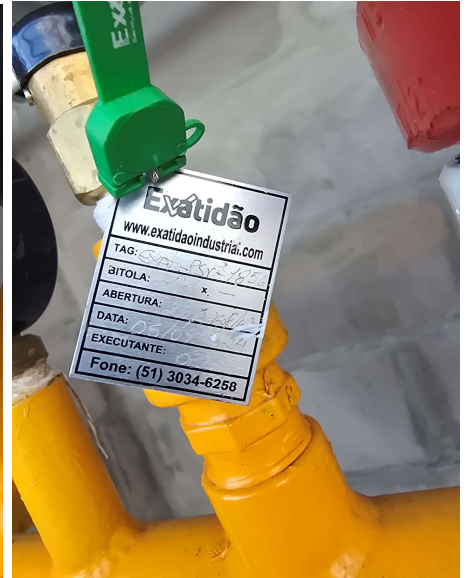

	RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DE TUBULAÇÃO CONFORME NR-13	Código: RG-CO.52.07 Revisão: 01 Página: 4/4
	Logo/Carimbo da Empresa Nº. Relatório fornecedor TUBULAÇÃO 2024	

RELAÇÃO PARCIAL DE EXIGÊNCIAS DA NR-13

ABREVIACIONES

P = Possui; NP = Não possui; NA = Não aplicável; I = incompleto

ITEM DA NR-13	DESCRIPÇÃO	SITUAÇÃO
13.6.1.1	Programa e plano de inspeção	P
13.6.1.2	Dispositivo de segurança contra sobre pressão na tubulação	P
13.6.1.3	Instrumento que indique a pressão de operação	P
13.6.1.4 a, b	Especificações e fluxograma da tubulação	P
13.6.1.4 c	Projeto de Alteração ou Reparo	NA

Local e data:

Canoas, 22/10/2024

Empresa Contratada:
GRA Instalações e Transportes de Gás Eireli
ENG. MIGUEL EDUARDO SUDBRACK
CREA RS038959
N.º da ART 13398801

Assinatura Engenheiro (PH)
