




RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA

BRAZCO SOLUCOES EM REFRIGERACAO LTDA EPP

Tubulação

2024

	RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DE TUBULAÇÃO CONFORME NR-13	Código: RG-CO.52.07 Revisão: 01 Página: 1/4
---	--	---

	Logo/Carimbo da Empresa	Nº. Relatório fornecedor TUBULAÇÃO 2024
---	-------------------------	--

IDENTIFICAÇÃO DA TUBULAÇÃO:

Proprietário: ULTRAGAZ/SC
Cliente: BRAZCO SOLUCOES EM REFRIGERACAO LTDA EPP
Endereço de Instalação: R SÃO PEDRO, 1403 - SÃO GUABIRUBA - SC
Etiqueta de identificação: -

TIPO DE TUBULAÇÃO

Fluido de serviço: GLP
Temperatura de operação: - 21° e < 65°
Pressão de operação: 1,5 kgf/cm²
Diâmetros: 3/4", 1"
Material: Aço Carbono

Descrição:

Rede líquida 3/4", Rede vapor 1"

Identificação do instrumento (manômetro):

14936230627 (rede líquida), 14938230728 (entrada do quadro de regulagem), 149242307

Identificação do instrumento (válvula):

VAL-993 (saída líquida tanques 1 e 2), VAL-990 (saída líquida tanques 3 e 4), VAL-994 (re

CARACTERÍSTICAS DA INSPEÇÃO


Inspeção periódica iniciada em 01/11/2024 e finalizada em 01/11/2024


DESCRIÇÃO E RESULTADO DAS INSPEÇÕES

Resultado exame: Apto

PLANO DE INSPEÇÃO:

Inspeção conforme exame interno a cada 6 anos.

	RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DE TUBULAÇÃO CONFORME NR-13	Código: RG-CO.52.07 Revisão: 01 Página: 2/4
---	--	---

	Logo/Carimbo da Empresa Nº. Relatório fornecedor TUBULAÇÃO 2024
---	--

CONCLUSÃO

Verificado que a tubulação não possui vazamento. Apta para operação.

RECOMENDAÇÕES E PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS

NA

DATAS PREVISTAS PARA PRÓXIMAS INSPEÇÕES


Inspeção: 01/11/2030



FOTOS:



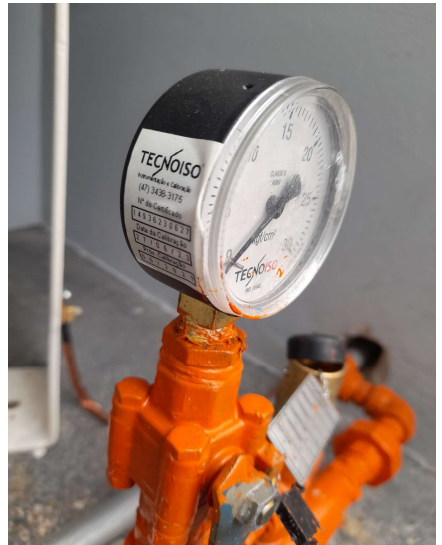

Logo/Carimbo da Empresa N°. Relatório fornecedor
TUBULAÇÃO 2024



	RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DE TUBULAÇÃO CONFORME NR-13		Código: RG-CO.52.07 Revisão: 01 Página: 4/4
		Logo/Carimbo da Empresa	N°. Relatório fornecedor TUBULAÇÃO 2024

RELAÇÃO PARCIAL DE EXIGÊNCIAS DA NR-13

ABREVIATURAS

P = Possui; NP = Não possui; NA = Não aplicável; I = incompleto

ITEM DA NR-13	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO
13.6.1.1	Programa e plano de inspeção	P
13.6.1.2	Dispositivo de segurança contra sobre pressão na tubulação	NA
13.6.1.3	Instrumento que indique a pressão de operação	NA
13.6.1.4 a, b	Especificações e fluxograma da tubulação	P
13.6.1.4 c	Projeto de Alteração ou Reparo	NA

Local e data:

Balneário Camboriu, 01/11/2024

Empresa Contratada:
 GRA Instalações e Transportes de Gás Eireli
 ENG. MIGUEL EDUARDO SUDBRACK
 CREA SC 192948-0
 N.º da ART 13398801

Assinatura Engenheiro (PH)
