

Relatório de Tarefas



Mig Soluções

Telefone: (51) 3478-6307

CNPJ: 12.507.499/0001-07

E-mail: miggas@miggas.com.br

Endereço: TAMOIO, nº1299 - Sem Complemento - Canoas - RS

Dados Cliente

Nome: LINEFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA E

Telefone:

CPF/CNPJ: 12.507.499/0001-07

E-mail:

Endereço: EST BR 116 22920, nº22920 - Sem Complemento - Caxias do Sul - R

Falar com:

Dados Tarefa

Técnico: GABRIEL FERNANDEZ MONTICELLI

Data: 10/10/24

Orientação: AGENDADA VISITA - LIGAR ANTES DE CHEGAR
55 54 9169-2979
~Samir Mattana

Início: 00:00

Fim: 16:48

Visita De Projeto Turnkey

4) AJUDANTE?

Não

5) QUEM?

Não

Não

71) NECESSARIO ESCADA/ANDAIME PARA EXECUCAO DE INSTALACAO? SIM OU NAO, SE SIM ESPECIFICAR

Sim. Instalação a ser realizada entre 3 e 4m de altura

72) EXISTE VIGA/LAJE NO TRAJETO DA TUBULACAO

Sim, contornaremos a viga

74) NECESSARIO MUNCK?

Não

75) NECESSARIO INSTALACAO DE BALIZADOR DE VAGA?

Não

76) CENTRAL COM PORTAO

Não

Não aplicavel

77) NECESSARIO FURO EM LAJE

Não

Necessário furar parede para tubulação entrar para o ponto de consumo

78) QUEM FARA O FURO

Verificar. Não combinei com cliente.

79) CENTRAL EM LAJE

Não

Não aplicável

80) SE NECESSARIO INSTALACAO DE REGULADOR EM PONTO DE CONSUMO, ESPECIFICAR AQUI (MANGUEIRAS,

Não é ponto completo

81) REGULADOR 2 ESTAGIO

Não é ponto completo

82) BITOLA INTERLIGACAO DE REDE

32mm

83) POSSUI EXTINTOR

Não

Não aplicável

84) COMPANHIA QUE ESTA INSTALADA

Ultragaz

85) NECESSIDADE DE MONTAGEM

Montagem da tubulação e ponto de consumo

87) IMPOSSIBILIDADES DE EXECUCAO

Trabalho em altura

90) O CLIENTE FOI INFORMADO SOBRE AS NECESSIDADES QUE DEVEM SER EXECUTADAS PARA A REALIZACAO


Não

181) E NECESSARIO REALIZACAO DE INTEGRACAO PARA REALIZACAO DA MONTAGEM?

Não

99) FOTOS

99) FOTOS

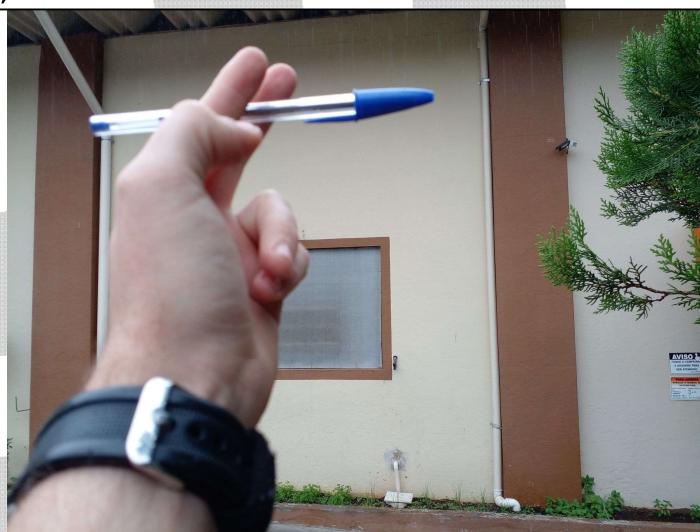


99) FOTOS



99) FOTOS



99) FOTOS

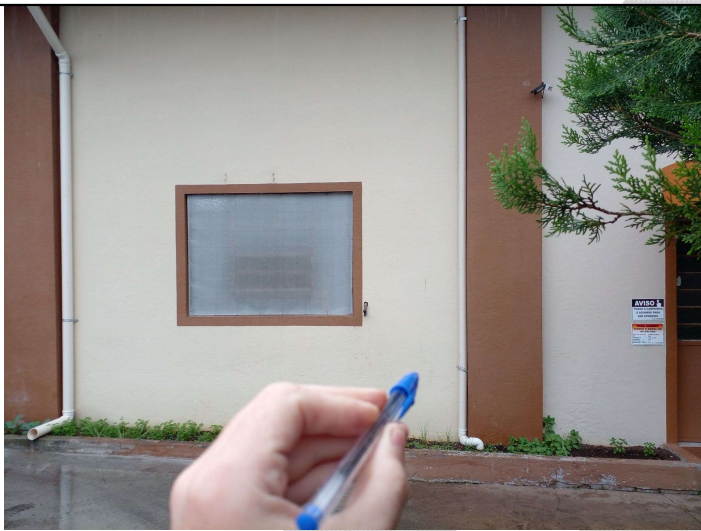

99) FOTOS



99) FOTOS



99) FOTOS



