

	<b>REGISTRO DE PROJETO - LEVANTAMENTO TÉCNICO</b>	CÓDIGO: RG-CO.22.05 REVISÃO: 02 PÁGINA: 1/5
--	---	---

<input checked="" type="checkbox"/> NOVO CLIENTE	<input type="checkbox"/> AS BUILT	<input type="checkbox"/> ADEQUAÇÃO
--	-----------------------------------	------------------------------------

**INFORMAÇÕES DO CLIENTE (LEVANTAMENTO EM CAMPO)**

RAZÃO SOCIAL: RB 286 INCORPORADORA LTDA		
ENDEREÇO: R RUI BARBOSA	Nº: 36	
CIDADE: FARROUPILHA	BAIRRO: CENTRO	CEP: 90450060
Nº PROJETO:	BASE INSTALADA:	

Normas Aplicáveis:	<input checked="" type="checkbox"/>	NBR13523	<input checked="" type="checkbox"/>	NBR15526	<input type="checkbox"/>	NBR15358	<input type="checkbox"/>	NBR 14024
Outras normas:						Data da Visita	29-08-24	

Descritivo da central de gás (Levantamento em campo):

**PROPOSTO: CENTRAL 2B190 + BOCAL DE ABASTECIMENTO + 15M REDE LÍQUIDA**

**REGULARIZACAO CLIENTE:**

- RETIRAR CANO DE FRENTE A CENTRAL
- FORNECER ART DE SUPORTAÇÃO DA LAJE
- MURETA DE CONTENÇÃO
- DISPOSITIVO PARA DRENAGEM PLUVIAL
- RAMPA DE ACESSO AOS TANQUES
- LOCAL DA CENTRAL E AREA DEVE SER IMPERMEABILIZADO


**PRAZO: REALIZAR ACOMPANHAMENTO**

**ACESSO TANQUES: ACESSO DO TANQUE ATRAVÉS DE MUCK**

**MELHORA DATA: A COMBINAR**

**TEMPO DE OBRA: 1 DIA**

**TRAJETO MANGUEIRA: 12 MTS**

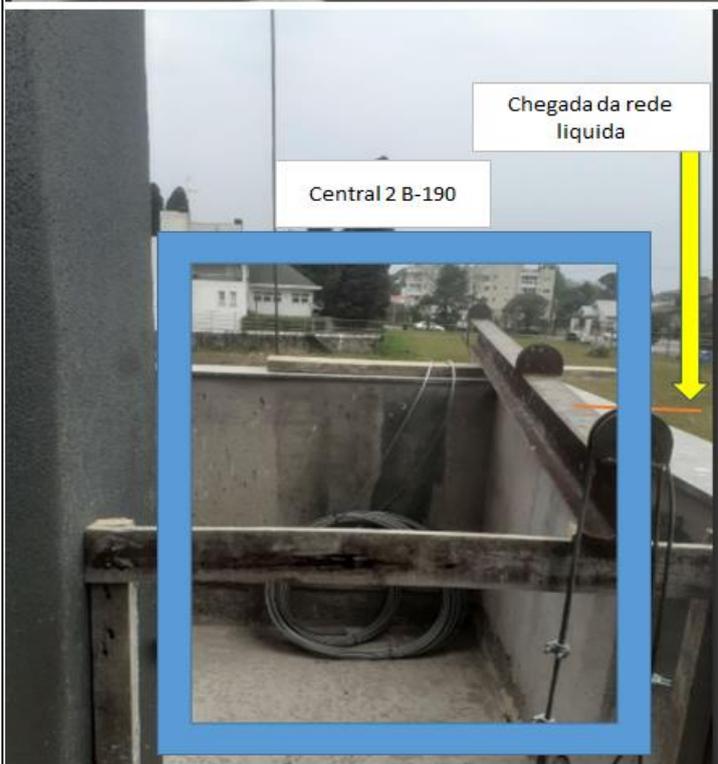


Profissionais  
Mendonça

Assistente  
R

Cliente  
Aguiar Calmeida Aguiar Calmeida

Data  
02/12/11

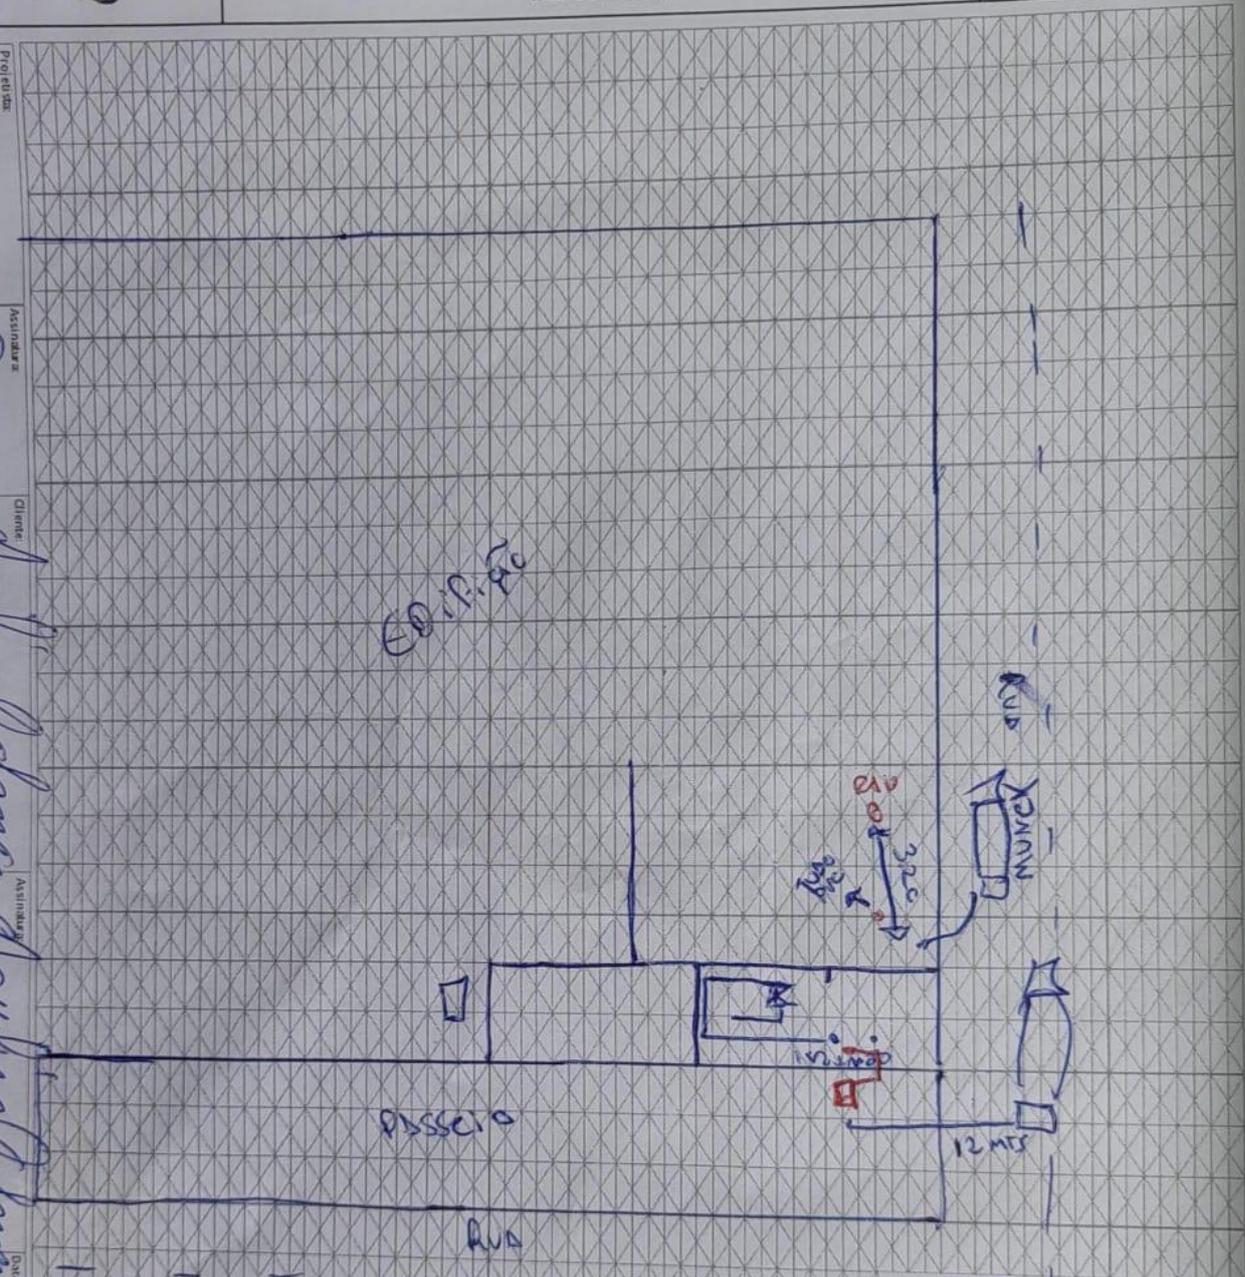

Adequação: Central  
20c Alturas  
2 de larguras  
1 de profundidade  
calçada fixa no frente  
da central

**REGISTRO DE PROJETO - LEVANTAMENTO  
TÉCNICO**

CÓDIGO: RG-CO.22.05  
REVISÃO: 02  
PÁGINA: 4/5

Nome Projetista:

Nome Cliente:XXX

Tel.:-----

**LISTA DE MATERIAIS DA OBRA**

CÓD. ORACLE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDE.
2100041	KIT CENTRAL 02 X B190/B125	UN	1
6800015	TUBO 3/4" SCH S/C	MT	15
2300100	COTOVELO 3/4" 90° NPT 300# PR	UN	8
3200037	PIG TAIL COBRE 1/4 X 800MM P45,P90,P190	UN	2
2300086	UNIAO 3/4" NPT 300# PR	UN	4
2300061	TEE 3/4" NPT 300# PR	UN	2
2300091	COTOVELO 3/4" 45° NPT 300# PR	UN	2
7500003	VÁLVULA ALIVIO HIDROSTÁTICO 1/2"/SEG LINHA 375 PSI	UN	1
2300007	LUVA 3/4" NPT 300# PR	UN	6
5300327	CAIXA DE PROTECAO DA VALVULA DE CORTE GERAL DE ABASTECIMENTO	UN	1
7300014	VALVULA ESF TRIPARTIDA 3/4"	UN	2
3200091	MANGUEIRA GLP 800 MM X 3/4" NPT	UN	2
5600083	ADAPTADOR DE ENCHIMENTO ACOPLADORA 3/4 X 1 3/4 ACME 3175	UN	1
4600003	MANOMETRO 0 A 21 KGF/CM CORPO 2 ROSCA 1/4"	UN	1
7300013	VALVULA ESF TRIPARTIDA 1/2"	UN	1
2300052	NIPL 1/2" NPT 300# PR	UN	2
2300067	TEE RED 3/4" X 1/2" # 300 NPT PR	UN	2
2200192	BUCHA RED 1/2" X 1/4" NPT 150# PR	UN	2
2200490	VÁLVULA ALIVIO HIDROSTÁTICO 1/4"/SEG LINHA 250 PSI	UN	1
-	VÁLVULA ALIVIO COM PURGA 1/4"	UN	1
7700015	VALVULA DE ENCHIMENTO 3/4" PARA REDE LIQUIDA	UN	1
5300213	SUORTE TIPO L PARA COLETOR	UN	10
5200005	ABRACADEIRA TIPO D C/CUNHA 1/2"	UN	6
5200027	BUCHA COM PARAFUSO 10 (TIJOLO FURADO)	UN	26
4900037	FITA VEDA ROSCA 18 MM X 50 M	UN	6
5300703	CONECTOR MACHO P/GAS 1/2" X 20MM PRENSAR	UN	2

**REGISTRO DE PROJETO - LEVANTAMENTO  
TÉCNICO**

CÓDIGO: RG-CO.22.05  
REVISÃO: 02  
PÁGINA: 5/5

5300704	CONECTOR MACHO P/GAS 3/4" X 20MM PRENSAR	UN	3
5300664	COTOVELO P/GAS 20MM X 20MM PRENSAR	UN	10
7300012	VALVULA ESF MONOBLOCO 3/4"	UN	1
N° DE PROJETO:		ASSINATURA DO PROJETISTA:	
